

PREPD 2025/2026

Planeamento da Dissertação

Monitorização e controlo de projetos

Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt

Reuniões de Ponto de situação

- Elemento do plano de comunicação do projeto constituído por interações com stakeholders com o objetivo de comunicar o estado do projeto
- Devem ter uma periodicidade e formatos regulares
- Devem reportar informação “entendível” para a audiência
- Deve ser composto por informação visualmente apelativa e com indicadores de severidade / atenção
- Pode ser um elemento de envolvimento e motivação
- Integração no plano de comunicação

Plano de comunicação

Communication plan example

 DESCRIPTION	 FREQUENCY	 CHANNEL	 AUDIENCE	 OWNER
Status updates	Weekly	Bordio	All stakeholders and project team	Project owner
Key stakeholder updates	Bi-weekly	Microsoft Meets	Key stakeholders	Project owner
Milestone updates	Upon completion	Bordio	Project team	Project owner
Issues	Immediately after identified	Slack	Project manager and project team	All project team members

Reuniões de Ponto de situação – possível agenda


- Sumário do projeto
 - Objetivos, planeamento inicial, timeline, status date
- Aprovação da reunião anterior e pendentes
- Informação de desempenho do âmbito tempo e custo:
 - Passado, atual e futuro
 - Tarefas mais atrasadas/ adiantadas e principais indicadores
 - Salientar conquistas
 - Ser claro nos pontos negativos
 - Utilização de dashboards
- Informação de alterações aprovadas e realizadas
- Informação de impactos não previstos e riscos
- Informações da equipa e impedimentos
- Próximos passos

Forma de reportar progresso

- Criação da baseline
- Atualização de Status Date
- Submissão de progresso
- Medição do âmbito, tempo e custo
- Utilização do MS Project?
- Replaneamento
- Monitorização de milestones e deadlines

Forma de reportar progresso

- Medição dos objetivos?
- Periodicidade de reuniões da equipa de projeto
- Periodicidade de reuniões de comité
- Matriz RACI

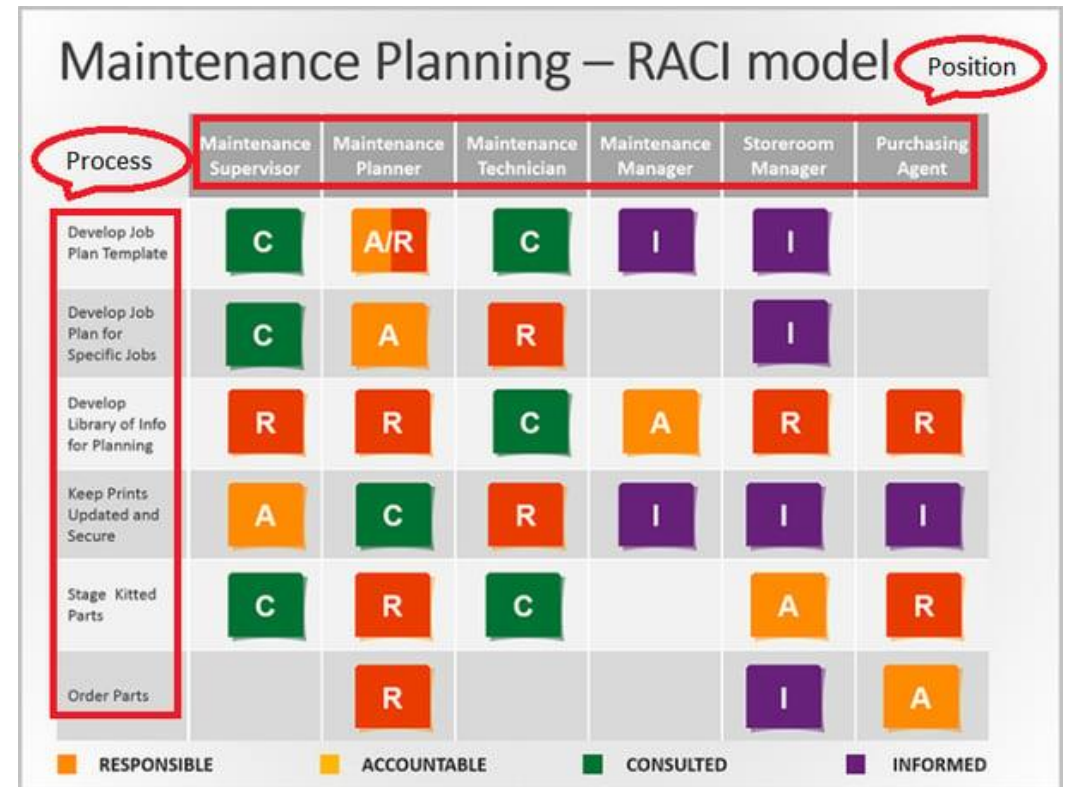

Elementos a considerar no plano PREPD:

- Criação de milestones
- Relatórios parcelares
- Reuniões com o respetivo formato e periodicidade
- Submissão do progresso

PREPD 2025/2026

Planeamento da Dissertação

Construção do cronograma

Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt
